

3.0

Terça-feira, 12/03/2013 12:26
Olá **MARCIO DE MORAES PALMEIRA**, seja bem-vindo!
Perfil: Administrador GEPnet(EGPE/CIGE)

EGPE/CIGE/DG/DPF
Escritório de Gestão de
Projetos Estratégicos





***DESVINCULADO DE PROGRAMA : EGPS-DLOG - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA PRÉDIOS PRÓPRIOS FUNCIONAIS - RESIDENCIAIS**

Patroci.: MARCOS ANTONIO FARIAS	Meta:(198.d) 05/04/2012 à 20/10/2012	Previsto: 58%	Ult.Foto: 04/05/2012	Prazo:
Gerente: MAURICIO PORCIUNCULA GARRIDO	Tendência: 27/10/2012 (204.d)	Concluído: 36%	Paralisado	Risco:
Adjunto: OEZER SOUSA BARROSO	Alinhamento Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais Estratégico: - Gestão de Obras e Infraestrutura	Natureza: INFRAESTRUTURA OBRAS		

Acompanhamentos:

(1)-18/10/2011 (2)-21/10/2011 (3)-01/12/2011 (4)-02/01/2012 (5)-
02/03/2012 **(6)-04/05/2012**

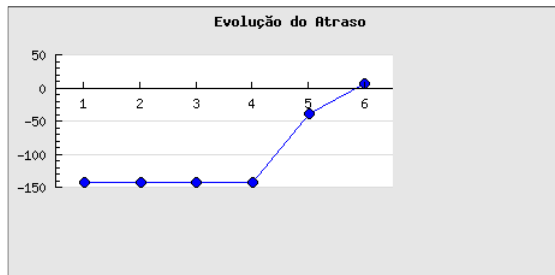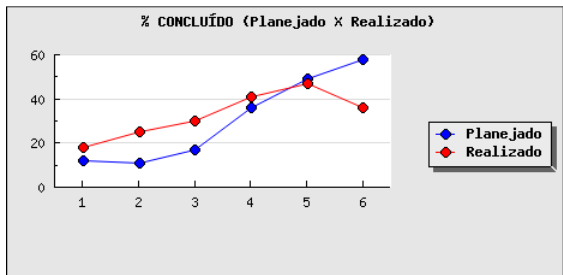

Projeto
Data Acompanhamento: 04/05/2012
Previsto: 58%
Concluído: 36%
Tendência Término: 27/10/2012
Cronograma:

Atividades Concluídas no Período

Não há atividades concluídas.



Próximo Marco
Próximo Marco: Contratação Concluída
Planejado: 01/01/2012
Previsão: 01/01/2012

Atividades em Andamento no Período

Não há atividades em andamento.



Motivo do Atraso

- A empresa contratada não só não iniciou a realização das sondagens e levantamento topográfico, bem como solicitou a rescisão contratual a qual foi aceita pela Administração. Encontra-se em trâmite procedimentos para a contratação de uma outra empresa classificada no certame licitatório.

Contramedida (R3G)

Não há contramedidas em andamento.

Irregularidades

Não há irregularidades, o que ocorre é a paralisação do projeto tendo em vista a rescisão contratual solicitada pela empresa LAF.

Obs.: para a geração do presente relatório foi necessária a alteração do cronograma em seus itens 38 e 40, pois, apesar do status -paralisado- o sistema exigia a alteração do cronograma desses itens.

Riscos

Descrição: Mão-de-obra contratada de baixa capacidade técnica
Causa: Critérios de avaliação técnica do edital
Consequência: Prejuízos ao erário e atraso.

Descrição: Elaboração dos projetos com qualidade técnica comprometedora
Causa: Empresas incompetentes
Consequência: Sérios prejuízos ao erário e atraso.

Entregas e Marcos do Projeto

Nome	Base Line	Início	Fim	%	Responsável
Definição das cidades	15/09/2011 à 23/09/2011	15/09/2011	23/09/2011	100%	
Definição da situação dos engenheiros da DEOB	15/09/2011 à 23/09/2011	15/09/2011	20/10/2011	100%	

<input type="checkbox"/> Diretrizes Arquitetura	24/09/2011 á 27/09/2011	24/09/2011 03/10/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Diretrizes Civil	24/09/2011 á 27/09/2011	24/09/2011 03/10/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Diretrizes Elétrica	24/09/2011 á 27/09/2011	24/09/2011 03/10/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Diretrizes Lógica	24/09/2011 á 27/09/2011	24/09/2011 03/10/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Diretrizes Mecânica	24/09/2011 á 27/09/2011	24/09/2011 03/10/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Finalização do Projeto Básico	28/09/2011 á 29/09/2011	04/10/2011 05/10/2011	100%	
<input checked="" type="checkbox"/> Finalização do Projeto Básico	29/09/2011 á 29/09/2011	05/10/2011 05/10/2011	100%	vilela.arav
<input type="checkbox"/> Edital	30/09/2011 á 10/10/2011	06/10/2011 08/11/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Parecer Jurídico	08/11/2011 á 08/11/2011	09/11/2011 18/11/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Publicação do Edital	09/11/2011 á 02/12/2011	30/11/2011 12/12/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Pregão	05/12/2011 á 13/12/2011	13/12/2011 21/12/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Adjudicação e Homologação	14/12/2011 á 15/12/2011	14/12/2011 15/12/2011	100%	
<input checked="" type="checkbox"/> Licitação concluída	15/12/2011 á 15/12/2011	15/12/2011 15/12/2011	100%	COAD
<input type="checkbox"/> Definir Fiscal do Contrato	21/11/2011 á 30/11/2011	21/11/2011 30/12/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Levantamento de dados topográficos e Sondagem	01/12/2011 á 31/12/2011	14/02/2012 12/06/2012	0%	
<input type="checkbox"/> Projeto Legal	06/03/2012 á 05/05/2012	12/06/2012 12/08/2012	0%	
<input type="checkbox"/> Anteprojeto	30/01/2012 á 05/03/2012	13/06/2012 27/07/2012	0%	
<input type="checkbox"/> Estudos Preliminares	15/12/2011 á 29/01/2012	13/06/2012 27/07/2012	0%	
<input type="checkbox"/> Projetos Executivos	06/03/2012 á 31/05/2012	28/07/2012 26/10/2012	0%	
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto Executivo Concluído	31/05/2012 á 31/05/2012	27/09/2012 26/10/2012	0%	Fiscalização
<input type="checkbox"/> Empenho	15/12/2011 á 15/12/2011	15/12/2011 15/12/2011	100%	
<input type="checkbox"/> Formalização do Contrato	16/12/2011 á 01/01/2012	16/12/2011 01/01/2012	100%	
<input checked="" type="checkbox"/> Contratação Concluída	01/01/2012 á 01/01/2012	01/01/2012 01/01/2012	100%	COAD

Documentos do Projeto


[Voltar](#)
